




Stokmarknes Båtforening

Pb 161. 8455 Stokmarknes. www.stokmarknesbatforening.no

Nye brygger planlegges i første omgang plassert på sørsiden av A-brygga.

Estimert ankomst medio juni.

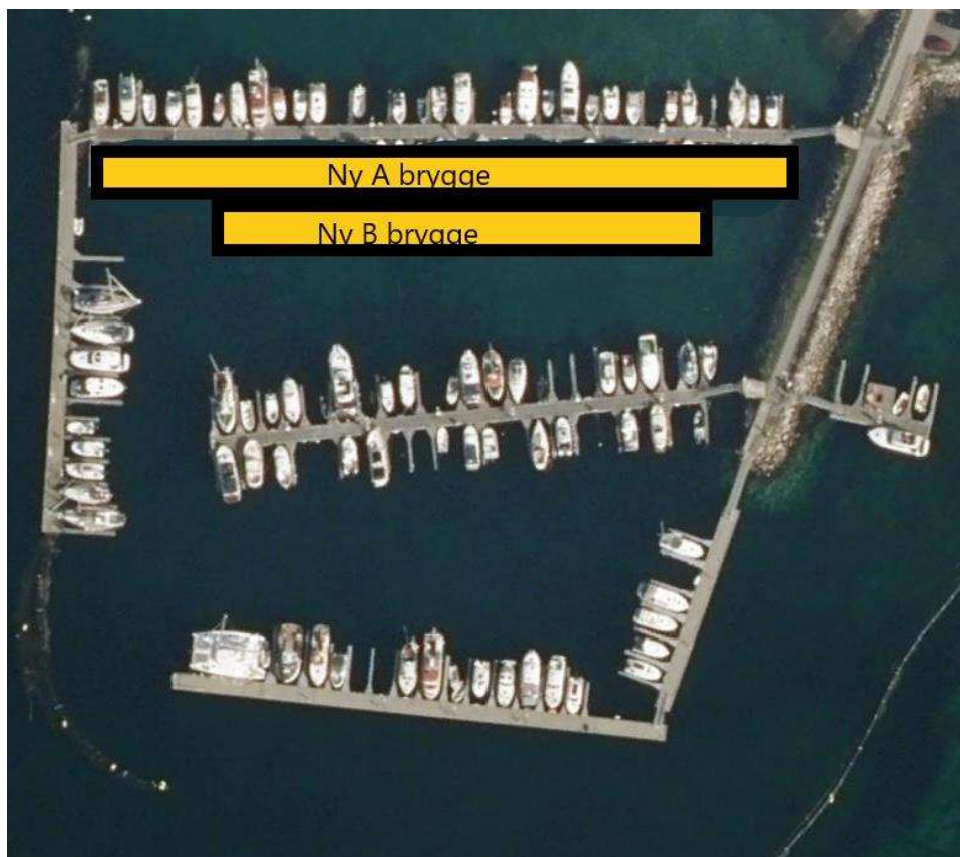

Forberedelse for mottak av nye betongbrygger

- Medlemmer med båtplass på sørsiden av A-brygga må påse at båter er fjernet innen 7 juni.
- Plasser ved øvrige brygger kan benyttes i påvente av ferdigstillelse. I tillegg kan det være anledning å låne plass andre steder.
- I perioden 7-9 juni vil alle utriggere demonteres og fraktet på land for avhending/deponi.
- Utstyr som tau/fender/sjakler etc må den enkelte plasseier selv demontere hvis en ønsker å ta vare på materiellet.
- De med båtplass deltar på fjerning av utriggere.

Demontering og avhending av utriggere


- Utriggere demonteres av bryggen og fløtes til utsettingsrampe for å tas på land for avhending.



Stokmarknes Båtforening

Pb 161. 8455 Stokmarknes. www.stokmarknesbatforening.no

Eksempel på rigg med plastfat som monteres mot bryggefeste (sett undenfra).

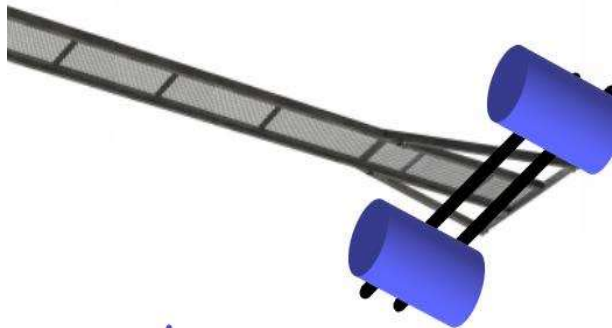

- Hvis forholdene er tilstede (flo/fjære) kan utriggere fløtes under landgangen til A-brygga. Alternativet er rundt anlegget og til utsettingsrampen.
- Utriggere er relativt tunge og man **bør** være 2-3 stk ved håndtering.
- Utriggere med dekke som kan gjenbrukes tas vare på for salg.
- Øvrig materiell avhendes mot deponi

Mottak og plassering av nye betongbrygger

- Bryggene losses av båt på havet ved Hurtigrutekaia
- Slepes deretter med egnet båt av medlemmer i SB til småbåthavna.
- I båthavna overtas slep av 2 mindre båter med slep foran og bak for lettere å manøvrere bryggene og for å unngå skader på annet materiell. Som sikring plasseres i tillegg 2 personer på brygge som slepes med båtshake for regulering av slepet.
- Bryggene fortøyes langs A-brygga
- Leverandør kobler bryggene sammen med spenn-wire i hele bryggepirens lengde mens de ligger longside A-brygga.
- Medlemmer som kan stille med båt sender mail til post@stokmarknesbatforening.no eller SMS til 99094221.

Innkalling til dugnad/fordeling av arbeidsoppgaver

- Demontering av utriggere på sørsiden av A-brygga skjer primært i uke 23, men det vil foregå dugnad fra uke 22.
- Plan for videre arbeid demontering/montering kommer. Bryggene må være oppspennet med wire før videre monteringsarbeid kan starte.
- Innkalling til dugnad skjer pr SMS



Stokmarknes Båtforening

Pb 161. 8455 Stokmarknes. www.stokmarknesbatforening.no

HMS

- Arbeidshansker, vernebriller, redningsvest
- Alt materiell og avfall skal tas på land for avhending
- Bruk egnet verneutstyr og verktøy
- Tilgjengelig førstehjelpsutstyr (styret)
- Det er begrenset med utstyr/verktøy tilgjengelig for utlån slik at den enkelte oppfordres å ta med nødvendig utstyr til arbeidsoppgave

Det opprettet "Nye brygger" på hjemmesiden som vi legger ut informasjon om status og fremgang.

Ta gjerne kontakt med oss i styret pr mail eller tlf.

Mvh styret i Stokmarknes båtforening 27 mai 2022
